**JUNTA DE VIGILANCIA DE LA CUENCA**
**DEL RIO HUASCO Y SUS AFLUENTES**

# MINUTA ESJ Nº 173 2016

Santa Juana, 21 de junio de 2016

Volumen Total Embalsado inicial = 116.75 mill. $m^3$ a las 8:30 hrs lunes 20 de junio de 2016

**Volumen y Cota Registrado a las 8:30 hrs del martes 21 de junio de 2016**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cota lago | = 632.66 | msnm | Vol. vacante o colchón | = 52.62 | mill. $m^3$ |
| Vol. total embalsado aprox. | = 117.258 | mill. $m^3$ | Porcentaje Vol. Total Embalsado | = 69.02 | % |
| Vol. útil total embalsado aprox. | = 113.40 | mill. m3 | | | |

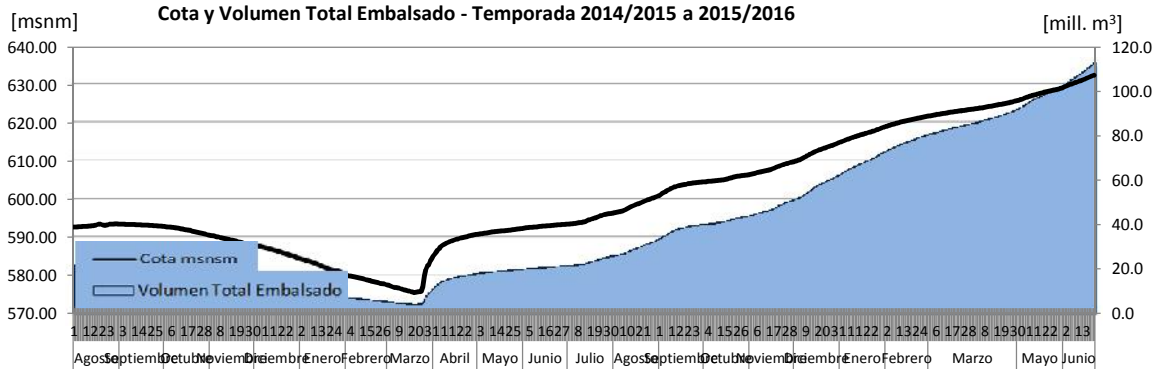


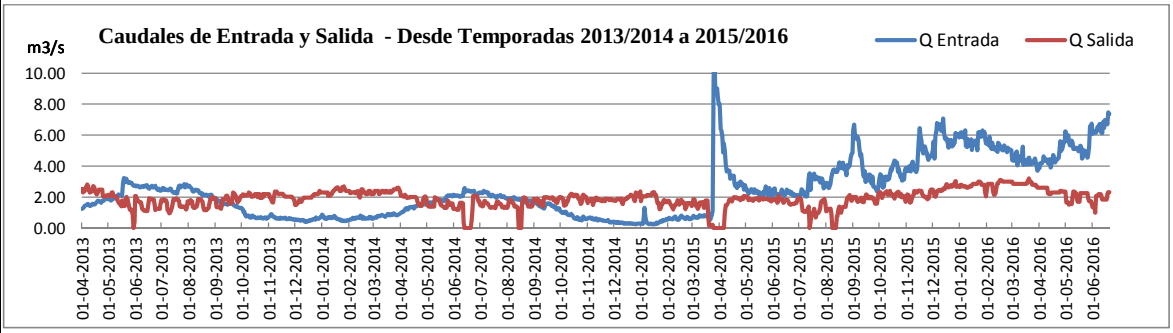


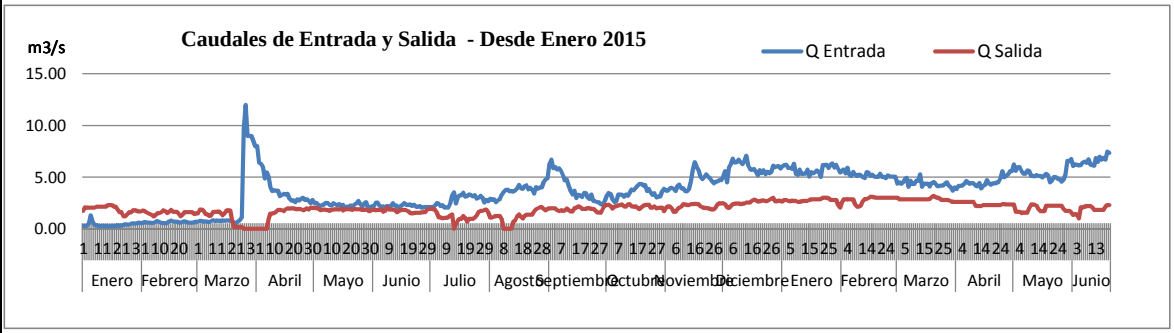


**Caudales medios aprox. registrados al lunes, 20 de junio de 2016**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Caudal Afluente | = | 7.36 | $m^3$/seg |
| Caudal de entrega por Válvulas JVRH | = | 0.00 | $m^3$/seg |
| Caudal de entrega por Válvulas HRH | = | 2.32 | $m^3$/seg |
| Caudal de entrega por Vertedero | = | 0.00 | $m^3$/seg |
| Caudal de entrega a riego | = | 2.32 | $m^3$/seg |

**Nota:** *El Caudal afluente corresponde a un caudal calculado

Administración Embalse Santa Juana
Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco y sus Afluentes
http://www.riohuasco.cl

cc. Archivo
